Timeline: Start Mon 29-11-10 — Finish Tue 31-05-11

		Nome da Tarefa	Duration
0		**315.Planeamento.20101125**	**73,76 days**
1	✓	Consignacao	1 day
2	✓	Aprovacao do DPSS	1 day
3		**Estaleiro**	**171,76 days**
4	✓	**Montagem**	**97,75 days**
5	✓	Contentores	23,88 days
6	✓	Is	15,25 days
7	✓	Infraestruturas Electricas	10,63 days
8	✓	Saneamento	10,63 days
9	✓	Vedacao	10,63 days
10	✓	Paineis Publicitarios	3 days
11		**Desmontagem**	**1 day**
12		Limpeza Estaleiro	1 day
13		Desativacao de Redes	1 day
14	✓	**Movimento de terras**	**50 days**
15	✓	Escavacao de Caixa	3,63 days
16	✓	**Aterros**	**11,25 days**
17	✓	Terreno Telheiro	4,63 days
18	✓	Terreno Ed. Principal	11,25 days
19	✓	**Superestrutura**	**91,1 days**
20	✓	**Estacas**	**9,63 days**
21	✓	Pateo	1 day
22	✓	edif. Principal	2 days
23	✓	Saneamento de cabecas	8,63 days
24	✓	**Betao Armado**	**34,13 days**
25	✓	**Edificio Principal - Betao Armado**	**30,13 days**
26	✓	**VF ed. Principal/Macicos**	**5 days**
27	✓	Cofragem/Ferro	5 days
28	✓	Betao	1 day
29	✓	Pilares	5,63 days
30	✓	Lajes Tecto R.C	1 day
31	✓	Platibandas Cobertura	6,63 days
32	✓	**Telheiro - Betao Armado**	**7,63 days**
33	✓	**VF Pateo/Macicos**	**7,63 days**
34	✓	Cofragem/Ferro	7,63 days
35	✓	Betao	1 day
36	✓	**Estrutura Metalica**	**7 days**
37	✓	**Ed. Principal**	**7 days**
38	✓	Est. Metalica Principal	4 days
39	✓	Madres e Contraventamentos	3 days
40	✓	**Telheiro**	**4,5 days**
41	✓	Pilares Metalicos ROR165	2 days
42	✓	Madres e Contraventamentos	2,5 days
43	✓	**Massames**	**70,22 days**
44	✓	**Ed. Principal**	**45,75 days**
45	✓	Geotextil 250	1 day
46	✓	Enrocamento	4,63 days
47	✓	betonilha reg.	1,5 days
48	✓	Impermeabilizacao	3 days
49	✓	filme Pvc	0,5 days
50	✓	Floormate	1 day
51	✓	Filme Pvc	0,5 days
52	✓	Laje Terrea	2 days
53	✓	**Telheiro**	**65,6 days**
54	✓	Toutvenant 0.15	22,88 days
55	✓	Laje Terra Simples 5cm	1 day
56	✓	Betonilha Afagada	1,5 days
57	✓	**Cobertura**	**32,25 days**
58	✓	**Edificio Principal**	**32,25 days**
59	✓	**Cobertura Tradicional - Tipo 1**	**23,98 days**
60	✓	Betao Leve/Pendentes	1 day
61	✓	Macicos Maquinas AVAC	2 days
62	✓	Betonilha Regularizacao	1,5 days
63	✓	Imp. Telas PVC Sikaplan 125GMA	5 days
64	✓	Geotextil	0,5 days
65	✓	Lajetas Termicas com Pes	4 days
66	✓	**Cobertura Chapa Metalica - Tipo 2**	**11 days**
67	✓	Chapa Haironville	2 days
68	✓	Isolamento Termico	0,3 days
69	✓	Imp. Tela Sikaplan 12G	5,7 days
70	✓	**Cobertura Chapa simples - Tipo 3**	**3 days**
71	✓	Chapa Trapeza	3 days
72	✓	**Alvenarias**	**16,13 days**
73	✓	Exteriores	11 days
74	✓	Interiores	11 days
75	✓	Cobertura(com Reboco)	5 days
76	✓	Forras Termicas+Isolamento	9 days
77	✓	**Cantarias**	**17,38 days**
78	✓	Peitoris	7 days
79	✓	Soleiras	4 days
80	✓	Bancadas IS Itaija	2 days
81	✓	**Especialidades**	**80,68 days**
82	✓	**Interior Edificio**	**72,06 days**
144	✓	**Exterior**	**70,81 days**
145	✓	Marcacoes/Abert. Valas	4 days
146	✓	**Rede de electricidade/Ited**	**30,94 days**
147	✓	**Caixas de Visita**	**23,13 days**
148	✓	alvenaria/Interior	11,38 days
149	✓	Aros e tampas	4,63 days
150	✓	Tubagens	18,5 days
151	✓	Ligacao Ramal novo/Ensaios	7,81 days
152	✓	**Rede de Abastecimento Agua**	**29 days**
153	✓	Tubagem do Ramal	17 days
154	✓	**Equipamentos**	**11 days**
155	✓	Contador	11 days
156	✓	Ensaios	1 day
157	✓	**Rede de Incendio**	**17,56 days**
158	✓	Tubagem PVC Rigido	13,56 days
159	✓	**Equipamentos**	**3 days**
160	✓	Marcos de Incendio 3un	3 days
161	✓	Ensaios	1 day
162	✓	**Rede de Esgotos Domesticos/Pluviais**	**65,66 days**
163	✓	**Caixas**	**50,22 days**
164	✓	Alvenaria/Interiores/soleiras	9,38 days
165	✓	Aros/Tampas	6 days
166	✓	Tubagem PVC	16,24 days
167	✓	Ligacao Ramais Publicos	7,63 days
168	✓	**Arranjos Exteriores**	**153,29 days**
169	✓	**Trab. Preparatorios**	**2 days**
170	✓	Demolicoes/Arranques de Pavimentos	2 days
171	✓	Abate de arvores	2 days
172	✓	Remocao de infraest. Existentes	2 days
173	✓	**Revestimentos**	**17,76 days**
174	✓	Blocos de Cimento	5 days
175	✓	**Lancil de betao**	**12,76 days**
176	✓	fundacao	2 days
177	✓	Lancil	10,76 days
178	✓	**Revestimentos**	**38,5 days**
179	✓	**Paredes e Tectos**	**17 days**
180	✓	**Reparacao de Paredes Escola Existente**	**17 days**
181	✓	Rep. Paredes Int.	8 days
182	✓	Rep. Paredes Ext.	9 days
183	✓	**Paredes e Tectos Novos**	**14,38 days**
184	✓	Rebocos Exteriores	10 days
185	✓	Rebocos Isanitarias	7 days
186	✓	Estuque Seral	10 days
187	✓	Azulejo Ceramico	5 days
188	✓	**Pavimentos/Rodapes**	**24,44 days**
189	✓	Betao Leve	1 day
190	✓	**Betonilhas**	**3,32 days**
191	✓	Betonilhas Gerais	2 days
192	✓	Betonilhas IS	2 days
193	✓	Mosaico Ceramico	4 days
194	✓	Vinilicos	7,5 days
195	✓	Rodape Vinilico	3,62 days
196	✓	**Pladur**	**4 days**
197	✓	Sancas Gesso Cart. 40x40	4 days
198	✓	**Carpintarias**	**14,12 days**
199	✓	Portas Interiores	4 days
200	✓	Armarios	2 days
201	✓	Cabides	2 days
202	✓	Prateleiras	2 days
203	✓	Paineis Carlite	2 days
204	✓	**Serralharias/Aluminios**	**62,52 days**
205	✓	Vaos de Aluminio	5 days
206	✓	Claraboias Cobertura	3 days
207	✓	Portas Metalicas (PE1, PE3)	2 days
208	✓	Vedacao	1 day
209	✓	**Pinturas**	**15,81 days**
210	✓	Exteriores	8,63 days
211	✓	Interiores	6,37 days
212	✓	Espelhos	0,5 days
213	✓	Estores Interiores	3,19 days
214	✓	Grades Metalicas	2 days
215	✓	Caixas de Correio	1 day
216	✓	**Telas Finais/Compilacao Tecnica**	**15,5 days**
217	✓	Electricidade/Ited	11,62 days
218	✓	Aguas e Esgotos	9,38 days
219	✓	Avac/Solar	15 days
220		**Conclusao de Obra**	**5 days**
221		Limpezas	3 days
222		Tapete	0,2 days
223		Recepcao Provisoria	1 day
224		Fecho	0 days

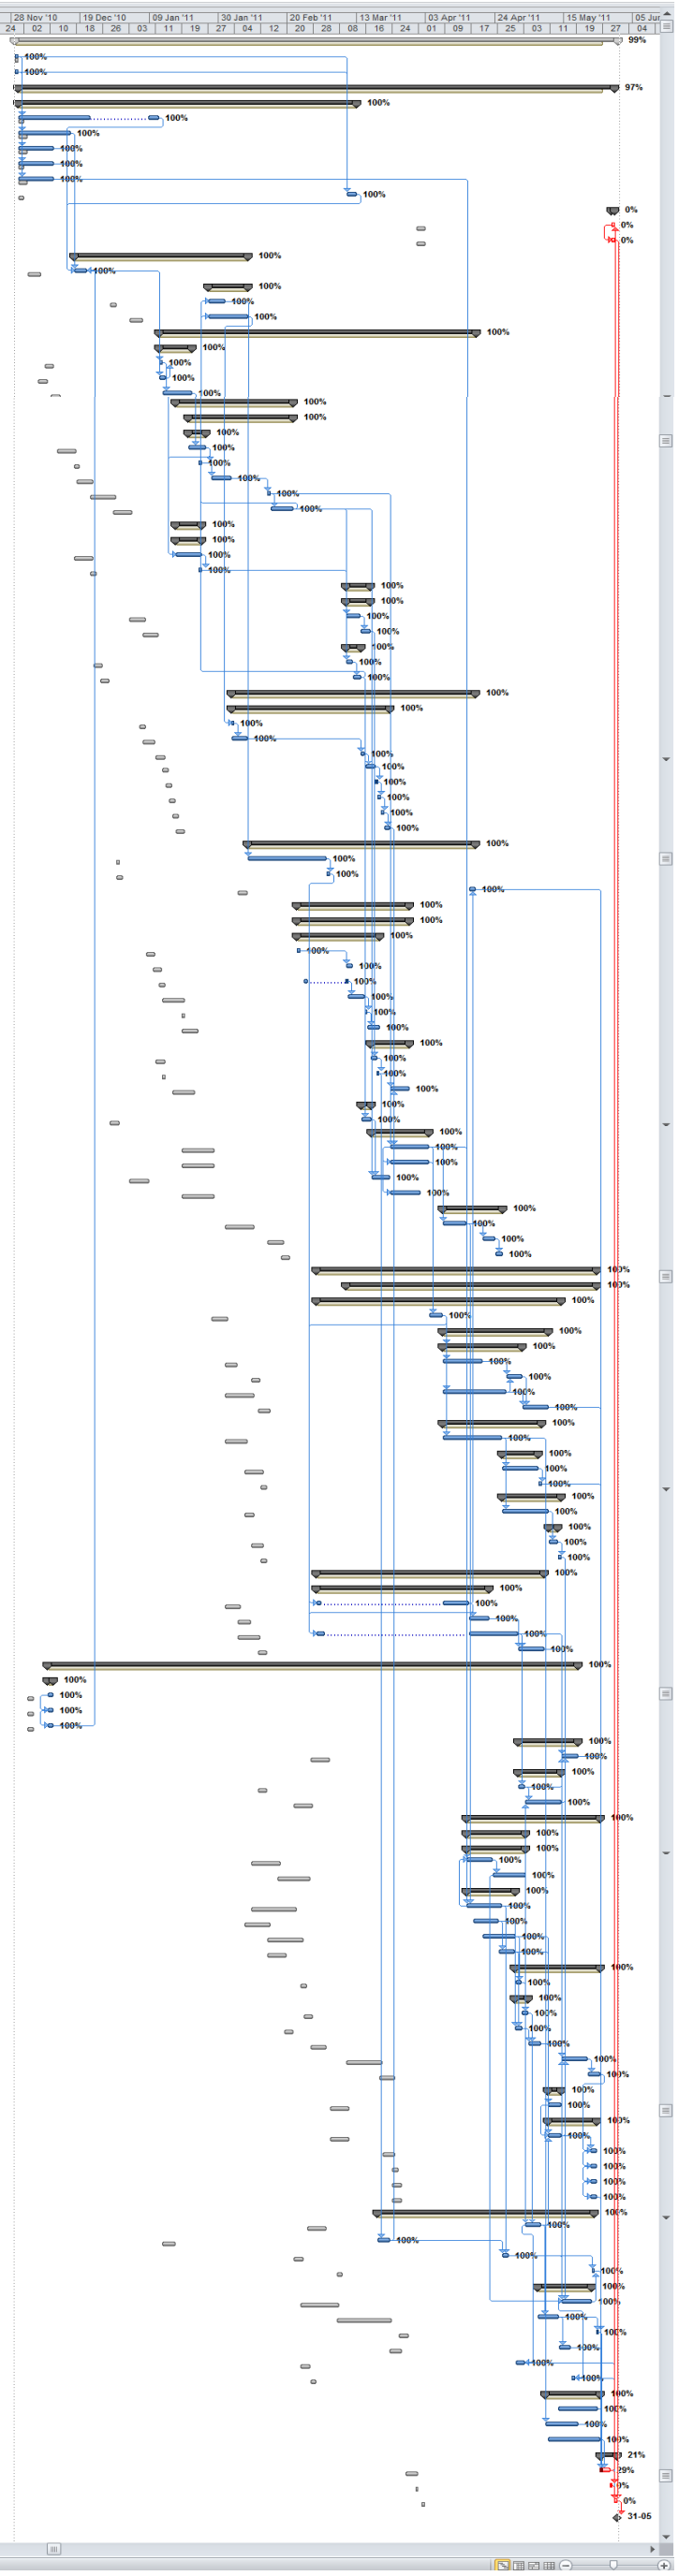

Ready | New Tasks : Auto Scheduled
