ID	Nome da Tarefa	Start	Finish	Duration	Predecessors
1	Lote 7 - IC8 - Proença-a-Nova/Perdigão (A23) - OBRAS DE ARTE	Mon 13-02-12	Wed 31-10-12	199 days	
2	Ponte Rio Ocreza	Mon 13-02-12	Wed 31-10-12	199 days	
3	Pilar 1	Mon 14-05-12	Thu 04-10-12	115 days	
4	Cimbre Móvel (P2 < P1 > E1) - 419.001-Foguet./PI	Mon 14-05-12	Thu 04-10-12	115 days	
5	Pré-montagem ao nível térreo (sistema A e B)	Mon 14-05-12	Mon 11-06-12	20 days	
6	Aduela 01A (h=11,008m)	Wed 30-05-12	Wed 30-05-12	1 day	
8	Aduela 01B (h=11,008m)	Tue 12-06-12	Fri 15-06-12	4 days	
12	Aduelas 02 (h=10,488)	Mon 18-06-12	Fri 22-06-12	5 days	
20	Aduelas 03 (h=9,969m)	Mon 25-06-12	Fri 29-06-12	5 days	
28	Aduelas 04 (h=9,463m)	Mon 02-07-12	Fri 06-07-12	5 days	
36	Aduelas 05 (h=8,989m)	Mon 09-07-12	Fri 13-07-12	5 days	
44	Aduelas 06 (h=8,524m)	Sat 14-07-12	Wed 18-07-12	4 days	
52	Aduelas 07 (h=8,105m)	Fri 20-07-12	Wed 25-07-12	5 days	
60	Aduelas 08 (h=7.686m)	Thu 26-07-12	Mon 30-07-12	4 days	
68	Aduelas 09 (h=7,298m)	Tue 31-07-12	Sat 04-08-12	5 days	
76	Aduelas 10 (h=6,881m)	Mon 06-08-12	Thu 09-08-12	4 days	
84	Aduelas 11 (h=6,481m)	Fri 10-08-12	Tue 14-08-12	4 days	
92	Aduelas 12 (h=6,144m)	Wed 15-08-12	Sat 18-08-12	4 days	
100	Aduelas 13 (h=5,808m)	Mon 20-08-12	Thu 23-08-12	4 days	
108	Aduelas 14 (h=5,533m)	Fri 24-08-12	Tue 28-08-12	4 days	
116	Aduelas 15 (h=5,259m)	Wed 29-08-12	Sat 01-09-12	4 days	
124	Aduelas 16 (h=5,030m)	Mon 03-09-12	Thu 06-09-12	4 days	
132	Aduelas 17 (h=4,818m)	Fri 07-09-12	Tue 11-09-12	4 days	
140	Aduelas 18 (h=4,650m)	Wed 12-09-12	Sat 15-09-12	4 days	
148	Aduelas 19 (h=4,484m)	Mon 17-09-12	Thu 20-09-12	4 days	
156	Aduelas 20 (h=4,365m)	Fri 21-09-12	Tue 25-09-12	4 days	
164	Aduelas 21 (h=4.277m)	Wed 26-09-12	Sat 29-09-12	4 days	
172	Aduelas 22 (h=4,2502m)	Mon 01-10-12	Thu 04-10-12	4 days	
180	Pilar 2	Mon 13-02-12	Thu 20-09-12	168 days	
181	Cimbre Móvel (E2<P2>P1) - 419.005-Foguet./PI	Mon 13-02-12	Thu 20-09-12	168 days	
182	Pré-montagem ao nível térreo (sistema A e B)	Mon 13-02-12	Fri 09-03-12	20 days	
183	Aduela 01A (h=11,008m)	Fri 11-05-12	Fri 11-05-12	1 day	
185	Aduela 01B (h=11,008m)	Fri 01-06-12	Fri 01-06-12	1 day	
187	Aduelas 02 (h=10,488)	Mon 04-06-12	Fri 08-06-12	4 days	
195	Aduelas 03 (h=9,969m)	Mon 11-06-12	Fri 15-06-12	5 days	
203	Aduelas 04 (h=9,463m)	Mon 18-06-12	Fri 22-06-12	5 days	
211	Aduelas 05 (h=8,989m)	Mon 25-06-12	Fri 29-06-12	5 days	
219	Aduelas 06 (h=8,524m)	Mon 02-07-12	Thu 05-07-12	4 days	
227	Aduelas 07 (h=8,105m)	Fri 06-07-12	Wed 11-07-12	4 days	
235	Aduelas 08 (h=7.686m)	Thu 12-07-12	Mon 16-07-12	4 days	
243	Aduelas 09 (h=7,298m)	Tue 17-07-12	Fri 20-07-12	4 days	
251	Aduelas 10 (h=6,881m)	Sat 21-07-12	Wed 25-07-12	4 days	
259	Aduelas 11 (h=6,481m)	Thu 26-07-12	Mon 30-07-12	4 days	
267	Aduelas 12 (h=6,144m)	Tue 31-07-12	Fri 03-08-12	4 days	
275	Aduelas 13 (h=5,808m)	Sat 04-08-12	Wed 08-08-12	4 days	
283	Aduelas 14 (h=5,533m)	Thu 09-08-12	Mon 13-08-12	4 days	
291	Aduelas 15 (h=5,259m)	Tue 14-08-12	Fri 17-08-12	4 days	
299	Aduelas 16 (h=5,030m)	Sat 18-08-12	Wed 22-08-12	4 days	
307	Aduelas 17 (h=4,818m)	Thu 23-08-12	Mon 27-08-12	4 days	
315	Aduelas 18 (h=4,650m)	Tue 28-08-12	Fri 31-08-12	4 days	
323	Aduelas 19 (h=4,484m)	Sat 01-09-12	Wed 05-09-12	4 days	
331	Aduelas 20 (h=4,365m)	Thu 06-09-12	Mon 10-09-12	4 days	
339	Aduelas 21 (h=4.277m)	Tue 11-09-12	Fri 14-09-12	4 days	
347	Aduelas 22 (h=4,2502m)	Sat 15-09-12	Thu 20-09-12	5 days	
357	Aduela de Fecho (meio vão)	Fri 05-10-12	Fri 12-10-12	6 days	
366	Aduela de Fecho (P2>E2)	Fri 21-09-12	Mon 15-10-12	19 days	
372	Aduela de Fecho (P1>E1)	Fri 05-10-12	Tue 16-10-12	7,75 days	
378	Desmontagem carro 419.005-Foguet./PI	Tue 16-10-12	Mon 29-10-12	10 days	371;365
379	Desmontagem carro 419.001-Foguet./PI	Wed 17-10-12	Tue 30-10-12	10 days	377;359
380	Cimbre ao solo E1>P1	Mon 02-07-12	Tue 04-09-12	55 days	
381	Cimbre ao solo E2 > P2	Mon 18-06-12	Wed 29-08-12	60 days	
382	Acabamentos	Wed 17-10-12	Wed 31-10-12	11 days	

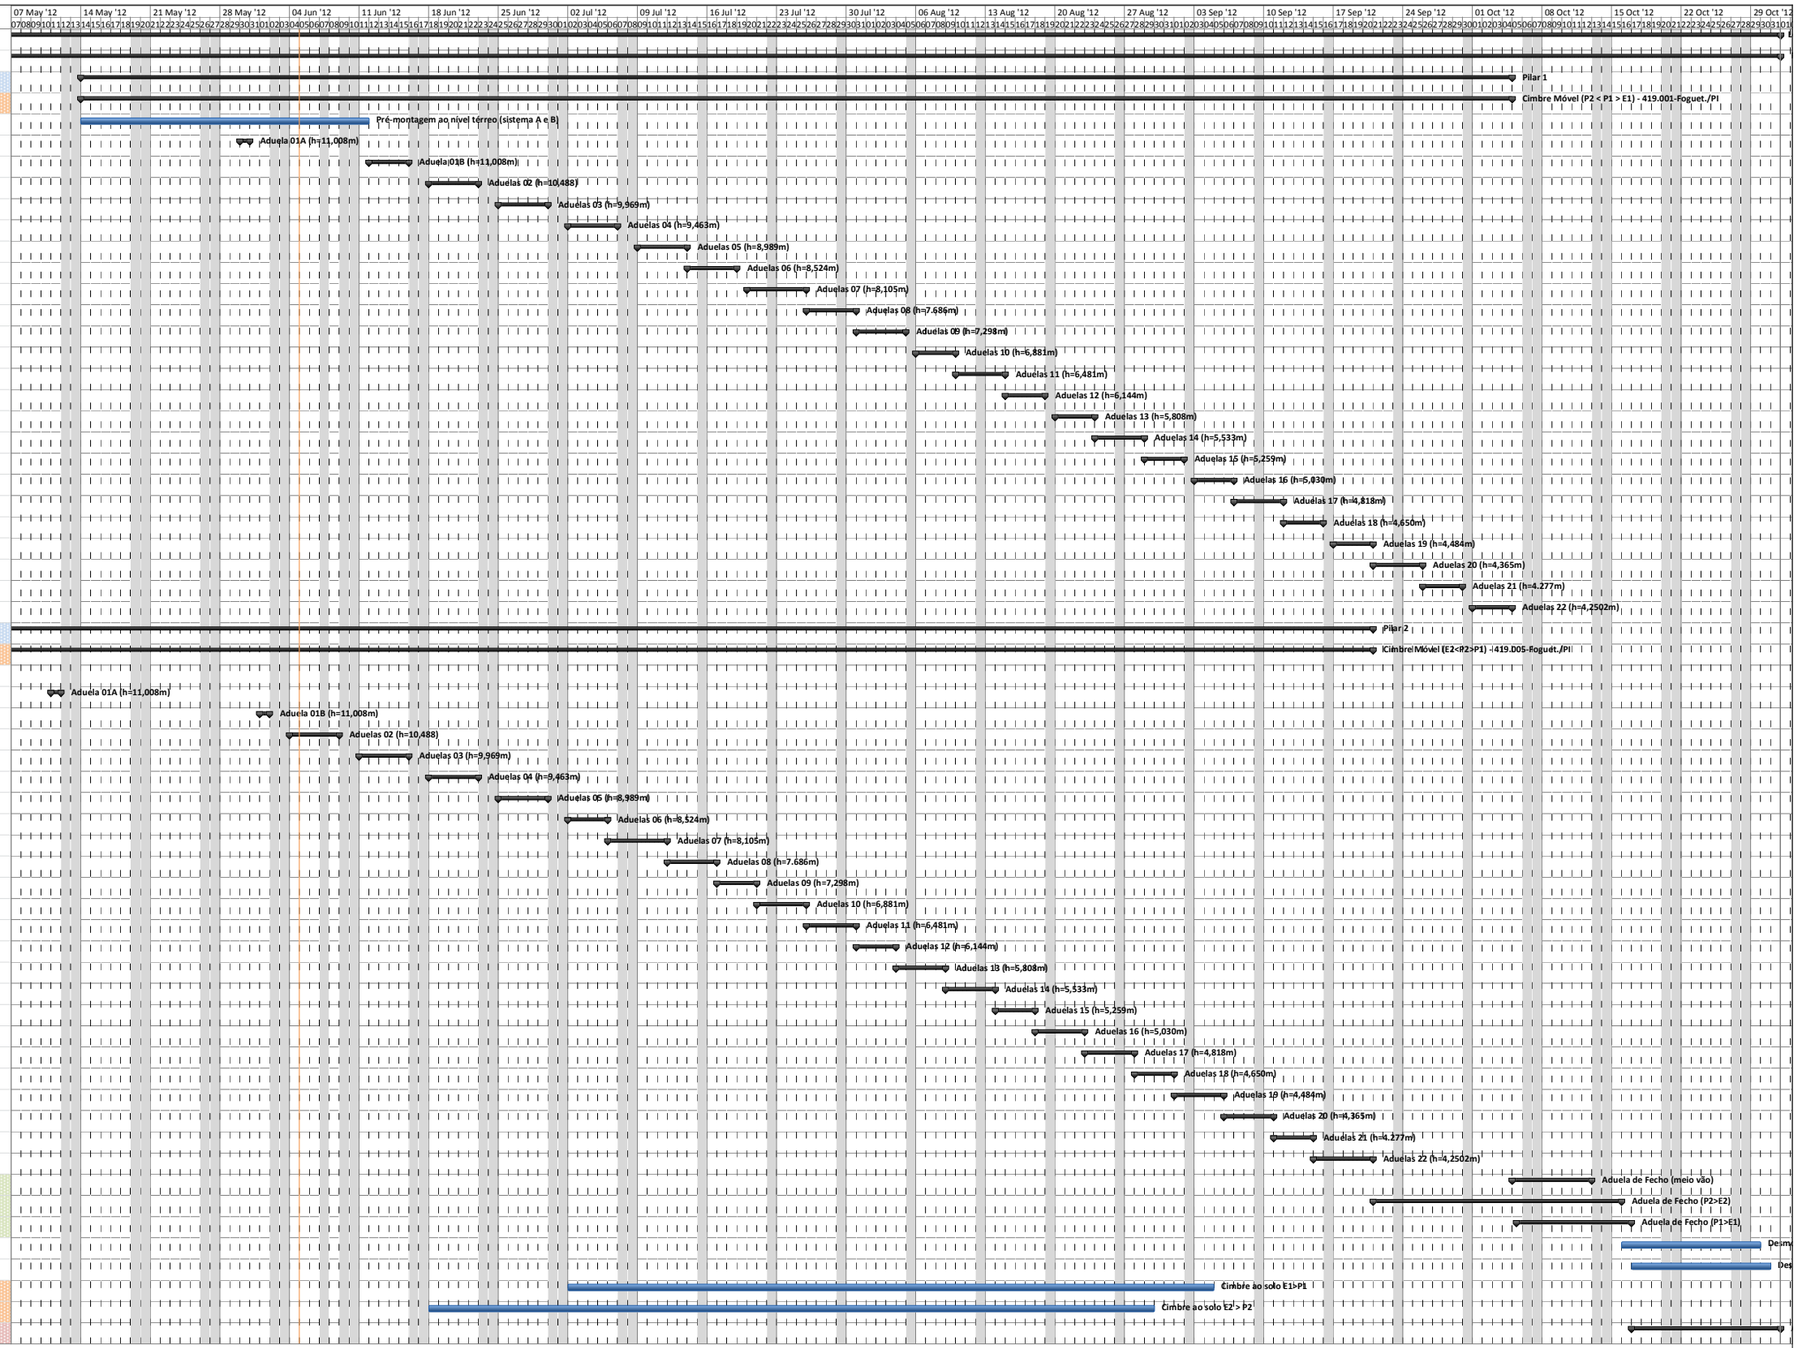

Projecto: Projecto1
Data: Tue 05-06-12

Tarefa · Marco · Resumo de Projecto · Marco Externo · Marco Inactivo · Tarefa Manual · Resumo da Agregação Manual · Apenas início · Prazo
Dividir · Sumário · Tarefas Externas · Tarefa Inactiva · Resumo Inactivo · Apenas-duração · Resumo Manual · Apenas-conclusão · Progresso
