


Processo construtivo da primeira fase:

- Implantação da obra, desmatagem e decapagem;
- Escavação;
- Execução das fundações;
- Execução total do encontro E1 e parcial do E2;
- Execução total dos pilares;
- Aplicação dos aparelhos de apoio.

Primeira Fase
ESCALA - 1:500

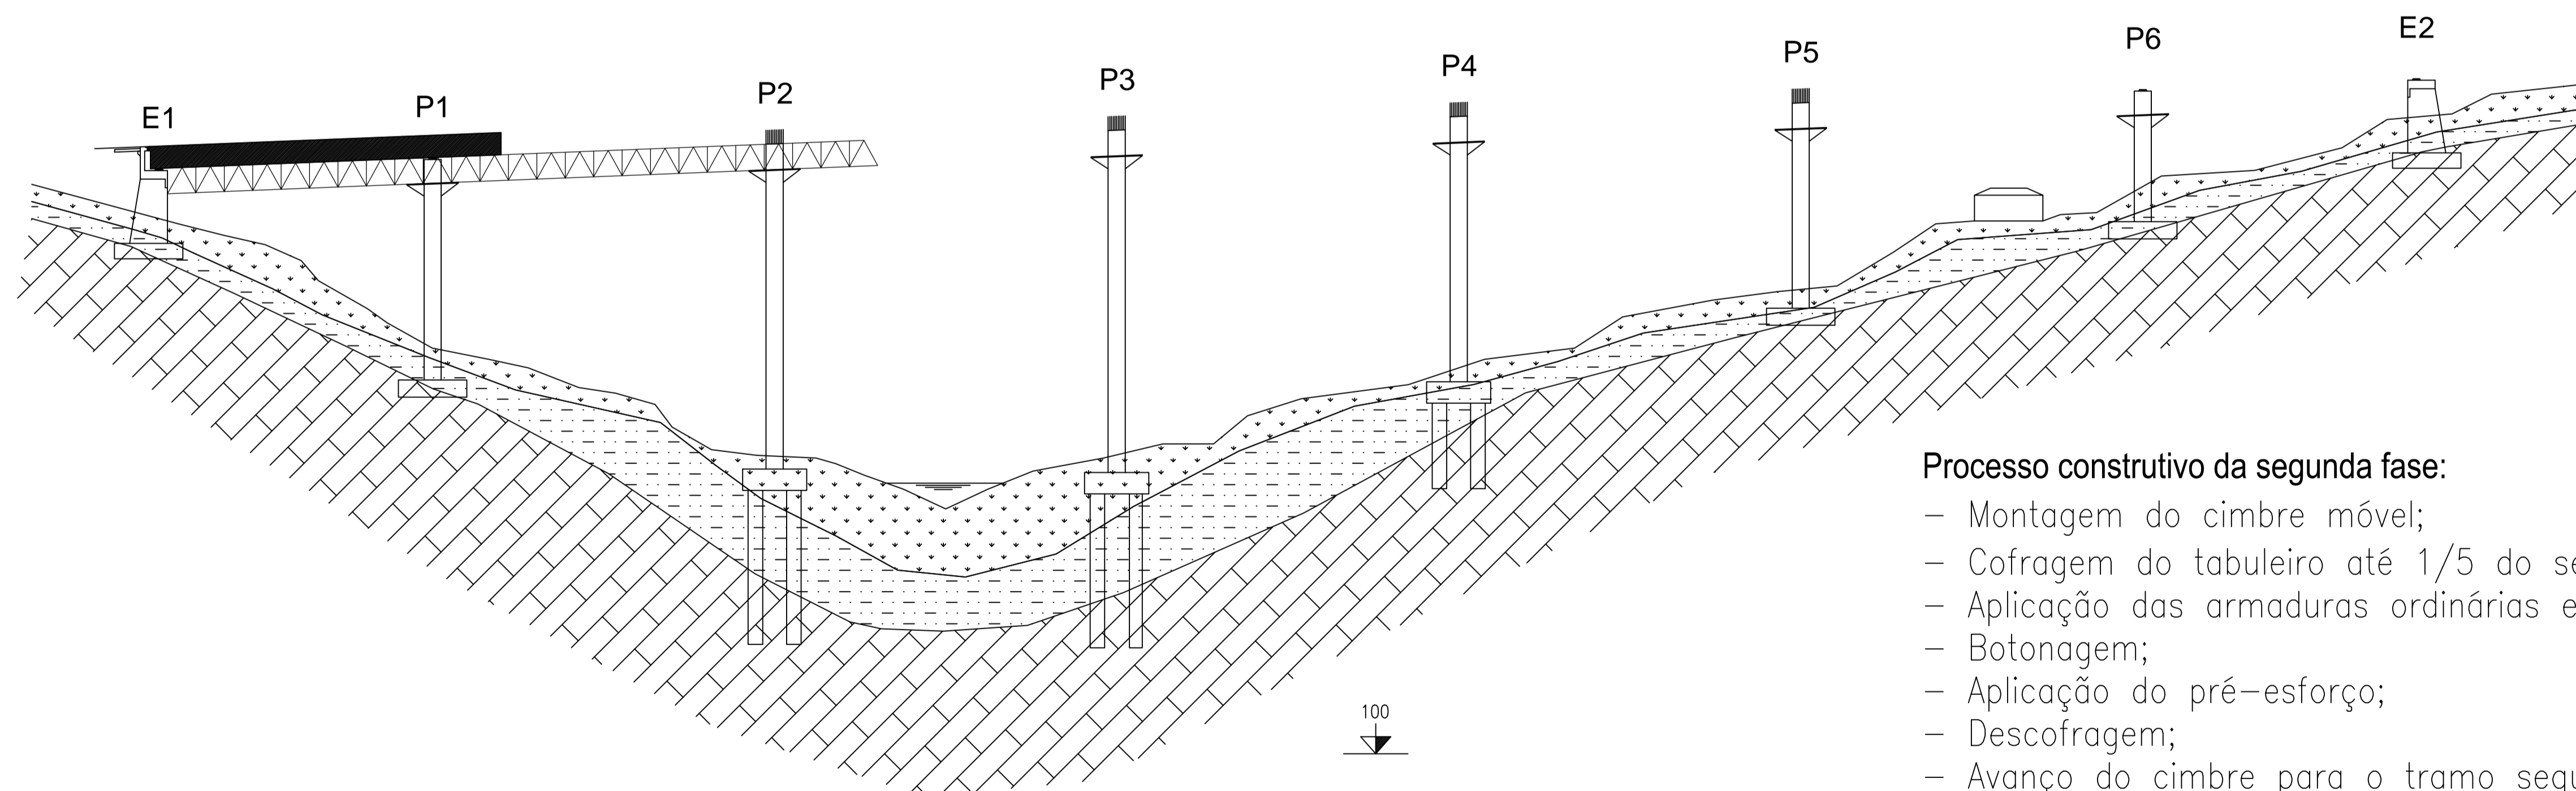


Processo construtivo da segunda fase:

- Montagem do cimbra móvel;
- Cofragem do tabuleiro até 1/5 do segundo tramo;
- Aplicação das armaduras ordinárias e das bainhas de pré-esforço;
- Botonagem;
- Aplicação do pré-esforço;
- Descofragem;
- Avanço do cimbra para o tramo seguinte.

Segunda Fase
ESCALA - 1:500

Nota: Escalas como indicado para formato A1 (em formato A3 considerar o dobro da escala indicada).

	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL TRABALHO FINAL DE MESTRADO	
	JOÃO PEDRO NETO PESTANA (LICENCIADO) Nº36633	PROJETO DE EXECUÇÃO DE UM VIADUTO RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO TRAMO A TRAMO
ESCALAS COMO INDICADO	FASEAMENTO CONSTRUTIVO ESQUEMÁTICO	DESENHO Nº: 19/21
JULHO DE 2016		
